


⑤ 水圧テスト結果のチャート紙

水圧検査結果報告書

- ・水圧計及びチャート紙は校正済みのものを使用し、故障がないこと。
- ・設定は、適正な目盛りを選択し、水圧維持がわかりやすい表記であること。
- ・60分以下のチャート紙を使用のこと。

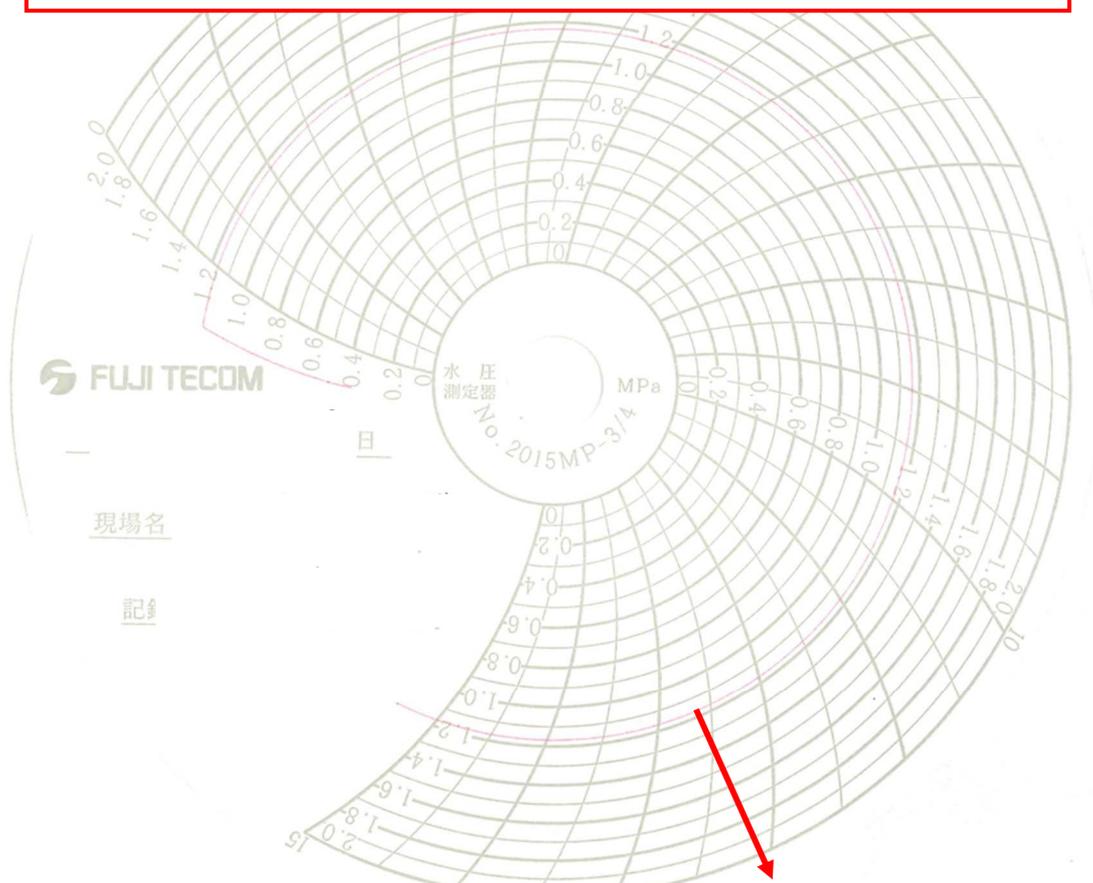

現場名

記録

明らかに手書きと見受けられた場合は再提出又は処分対象。

工事名称	水道 一郎 宅		
工事場所	桜宮町 214 番地 10		
給水番号		氏名	申込者又は使用者
測定日(検査日)	令和 8 年 4 月 1 日		
測定者	会社名	近江設備株式会社	
	担当者	八幡 太郎	
検査圧力	<input checked="" type="checkbox"/> 給水	1.0 Mpa	15分以上
	<input type="checkbox"/> 本設	0.8 Mpa	24時間以上
	<input type="checkbox"/> 仮設	0.8 Mpa	12時間以上
